



TOUT POUR L'EAU, L'EAU POUR TOUS

# **Territoire du SUD du LOT Alimentation en eau potable**

*Renouvellement et restructuration du réseau d'eau potable*

*Le Bourg*

**Commune de MONTPEZAT D'AGENAIS**

**Réunion publique du  
Mercredi 9 juillet 2025**




## SOMMAIRE

- **Présentation des intervenants**
- **Objectif des travaux**
- **Présentation des travaux**
- **Emprise des travaux et calendrier prévisionnel**
- **Phasage des travaux**
- **Informations diverses**
- **Coûts et financement**

# OBJECTIF DES TRAVAUX

## Renouveler, restructurer et renforcer les canalisations d'eau potable sur le secteur Bourg

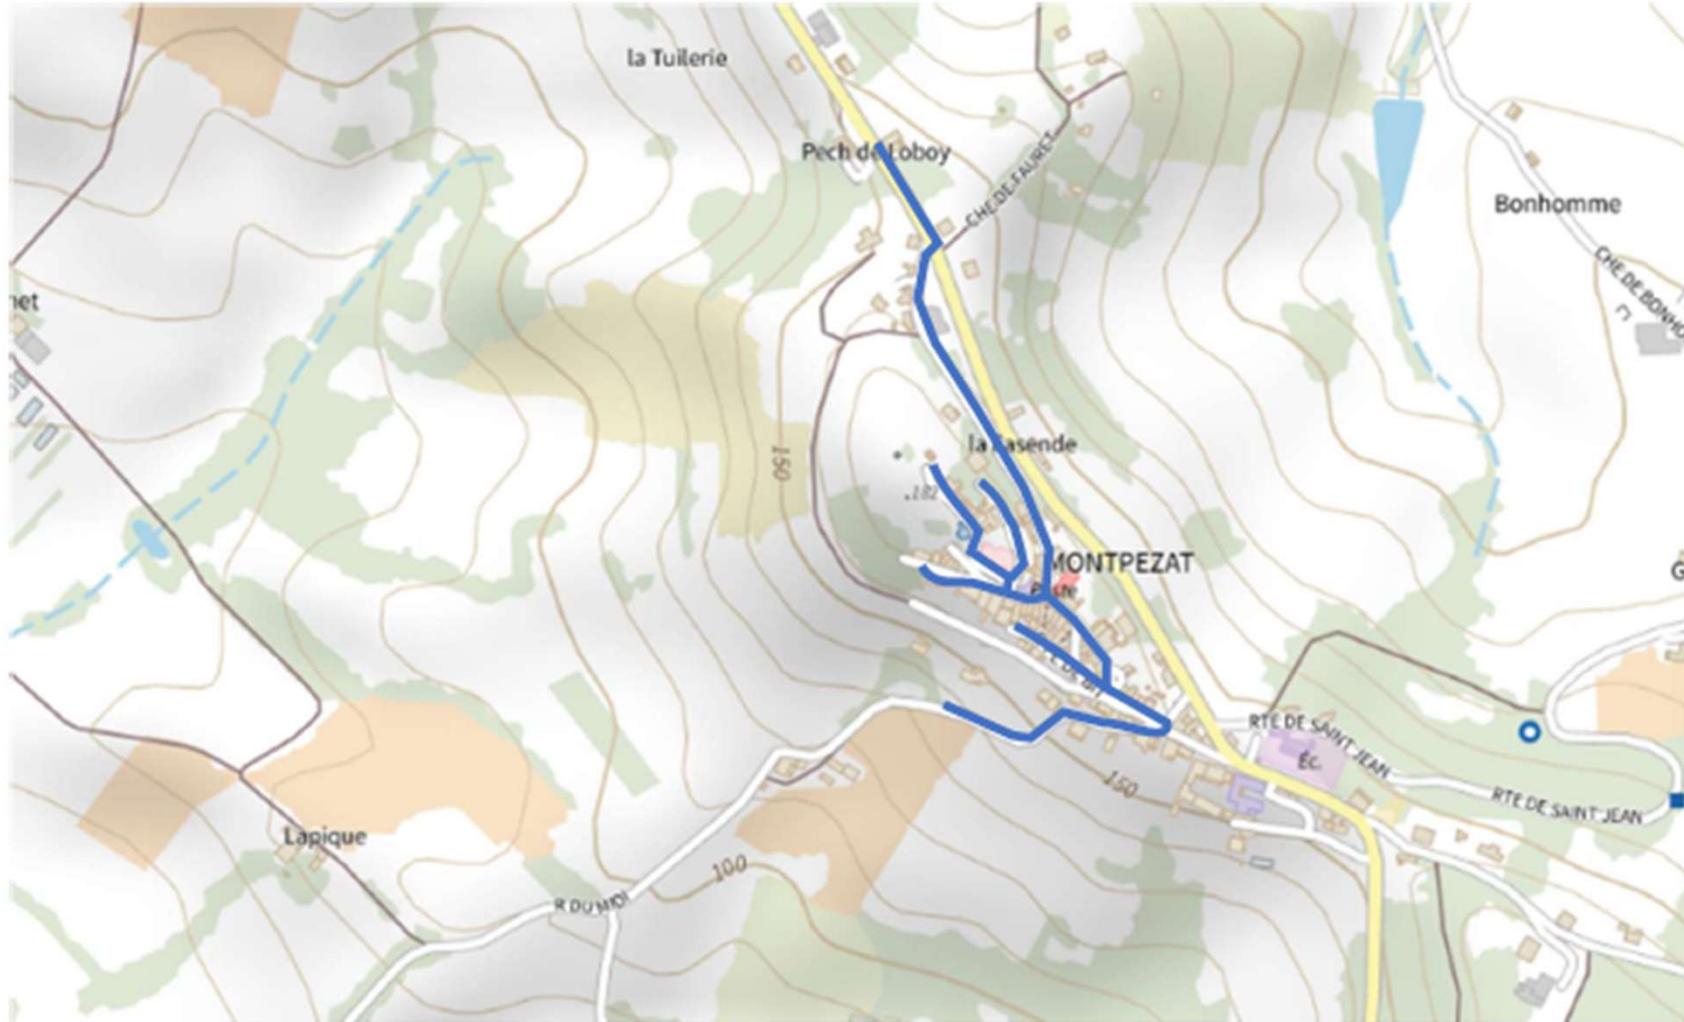



# PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

- **Maîtrise d'ouvrage : EAU47**
  - M. PEYRILLES : 05 53 68 12 40
  
- **Maîtrise d'œuvre réseaux : EAU47**
  - Mme DELLA VALENTINA : 05 53 68 48 45
  
- **Entreprise de travaux : SOGEA Sud Ouest Hydraulique**
  - M. LASCAZES : 06 19 57 35 92
  
- **Exploitant du réseau : SAUR**



# PRÉSENTATION DES TRAVAUX


- **Renouvellement de 1 660 mètres de réseau d'ossature et de 98 branchements.**
- **Déplacement des compteurs en limite de domaine public.**
- **Pose d'un stabilisateur de pression dans le réservoir.**

**Permettre une meilleure exploitation du réseau et ainsi améliorer la qualité de service aux abonnés et son rendement.**



## Début des travaux : 02 Septembre 2025


## Durée des travaux : 5 mois

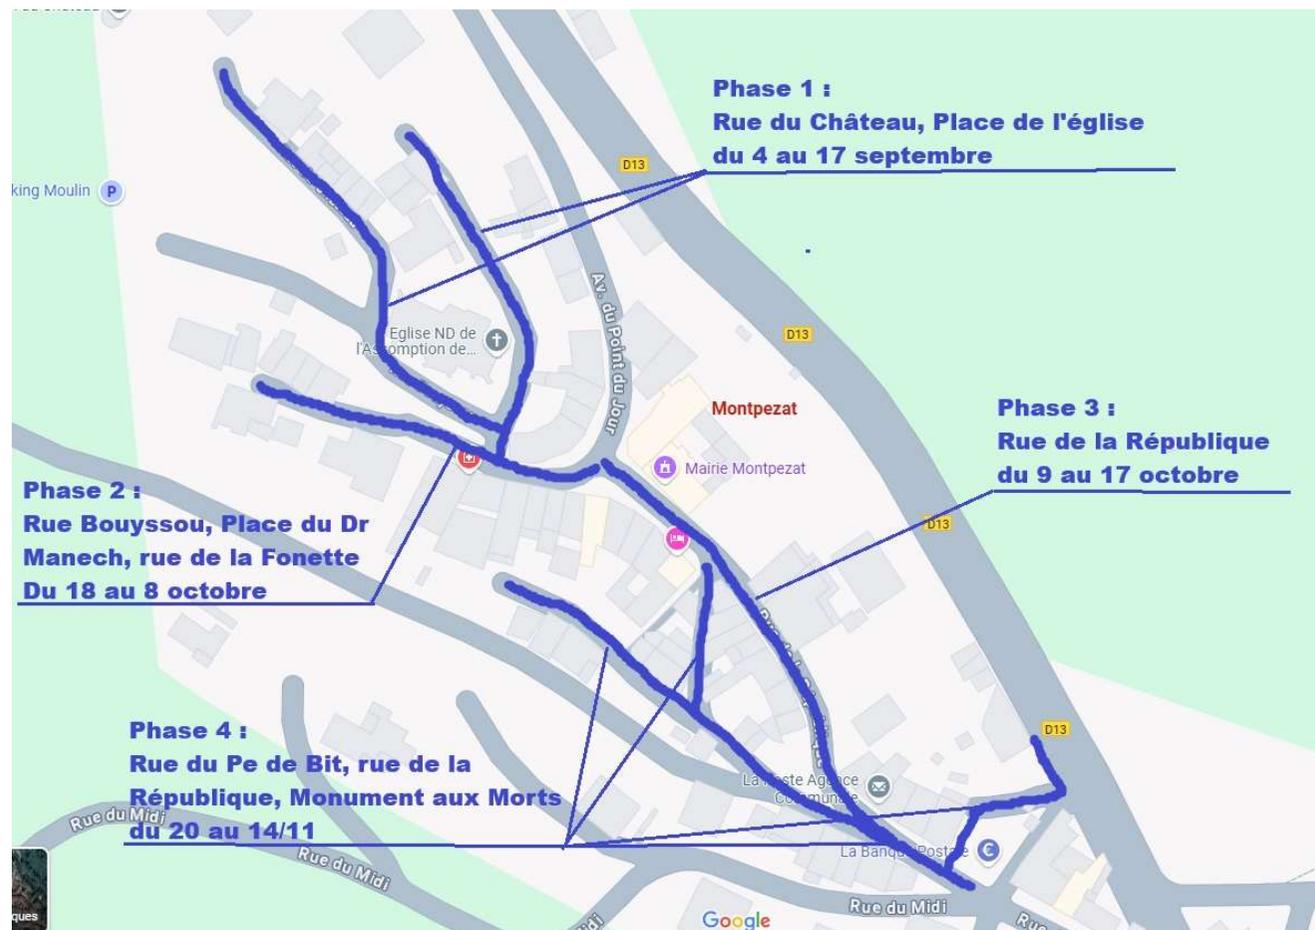



**Phase 6 : Av du point du  
Jour, Chemin de Fauret,  
Av de l'Abbé Delagne  
Du 26/11 au 17/12**

**Phase 5 : rue du Midi  
Du 17/11 au 25/11**

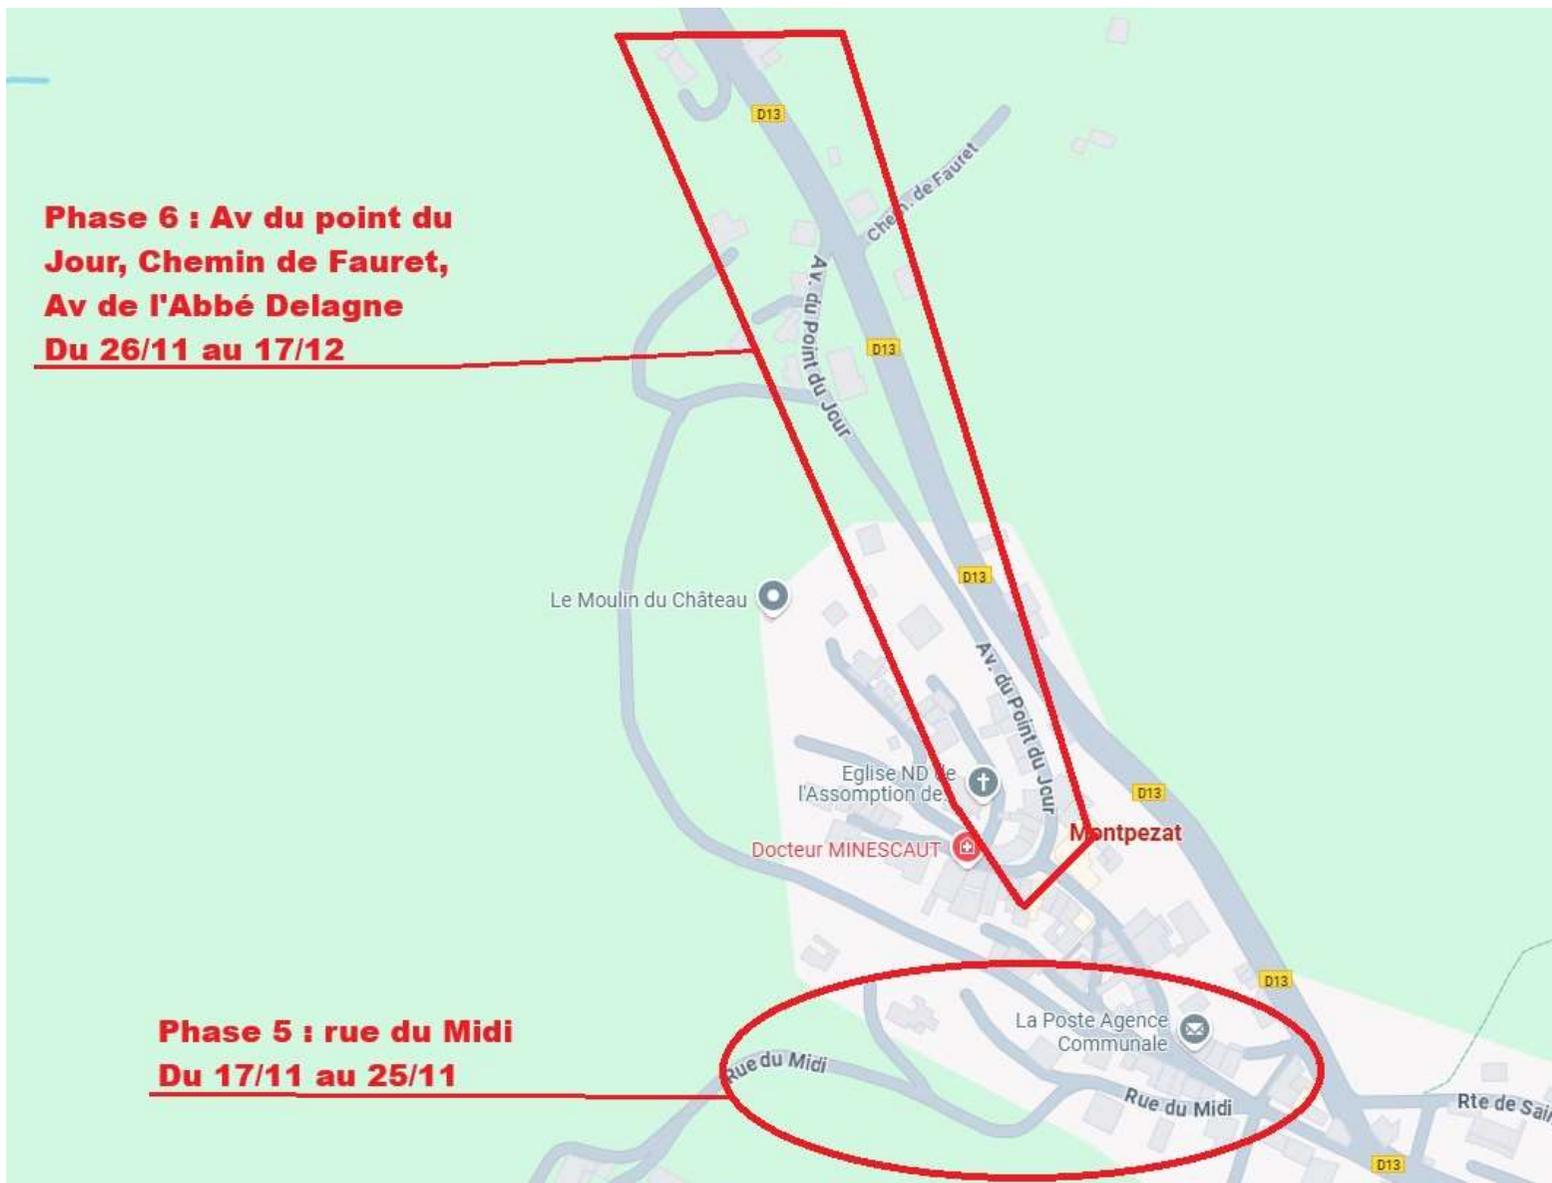



# PHASAGE DES TRAVAUX

**1 – Rue du Château, place de l'église : du 04/09/2025 au 17/09/2025**

**2 – Rue Bouyssou, Place du Dr Manech, rue de la Fonette : du 18/09/2025 au 08/10/2025**

**3 - Rue de la République : du 09/10/2025 au 17/10/2025**

**4 – Rue Pet de Bit, rue de République, monument aux morts : du 20/10/2025 au 14/11/2025**

**5 – Rue du Midi : du 17/11/2025 au 25/11/2025**

**6 – Av du point du Jour, chemin de Fauret, Av de l'Abbé Delagne : du 26/11/2025 au 17/12/2025**

**7 – Mise en eau, rinçage, essais, basculements des branchements : du 18/12/2025 au 30/01/2026**



## INFORMATIONS DIVERSES

- **Constat d'huissier préalable au démarrage des travaux (depuis le domaine public)**
- **Travaux importants sur les voiries : circulation adaptée afin de limiter la gêne**
- **Si présence de rocher, utilisation d'un brise roche hydraulique**
- **Avant le raccordement sur la nouvelle conduite (phase n° 7) :**
  - **Essais pression sur les canalisations**
  - **Information des riverains pour coupure(s) d'eau**



# COÛTS ET FINANCEMENT



**Montant des travaux: 386 400 € HT**

**Financement: 100% par EAU47**

**(y compris travaux de raccordement en domaine privé)**

***Aucune participation financière ne vous sera demandée.***



**Merci de votre attention**
